

## Svängd enloppstrappa, en del per våning TYP M12-00-1

Lagringsanvisning:

### Introduktion

Läs noggrant genom Lagrings- och Montageanvisningarna innan hantering av element påbörjas. Vid oklarheter kontakta Herrljungatrappan. Elementen är uppmärkta med ordernummer, elementlittera samt vikt. Elementlittera för trappa återfinns i principsektionen på monteritritning.

### Lagring, transport och lossning

Vid lossning av trappor används fyra stycken ingjutna wirar i trappsidan.

En 4-parts lyftgrimma kopplas till wirar alternativt används en monteringsbom.

Mellanlägg ska användas där wire ligger an mot trappkanter, se fig. 1211.

Viktigt att tänka på vid hantering av trappan är att ingen belastning får ske i framkant och underkant, se fig. 1212.

### Lagring

Trappan lagras på plant underlag i transportläge, liggandes med kupan nedåt på tre pallningspunkter. Pallningsvirke eller liknande läggs så att löpen ligger fritt från mark, se fig. 1213. För att spara plats kan trappor lagras omlott.

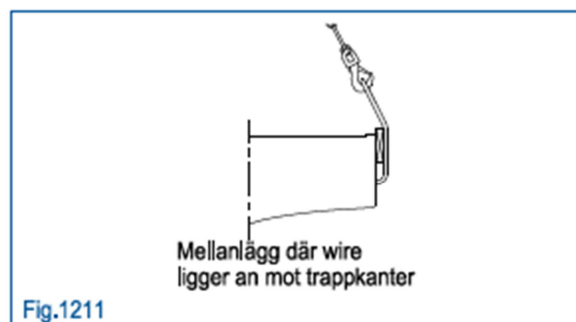


Fig.1211

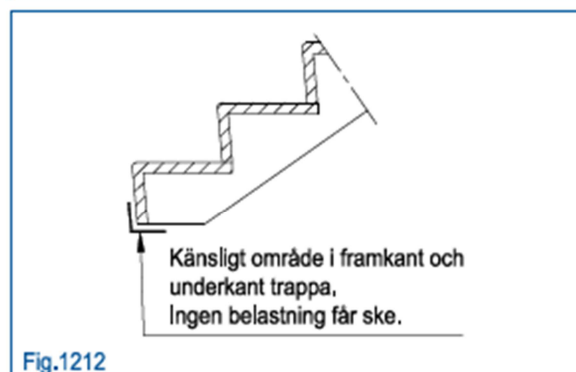


Fig.1212

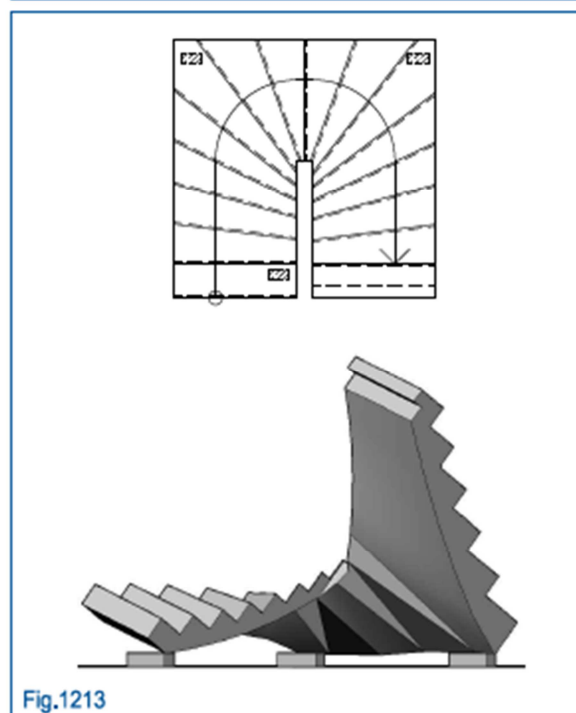


Fig.1213

## Svängd enloppstrappa, en del per våning TYP M12-00-1

Lyftanvisning:

### Lyft av trappor i montageskede


Montagelyft kopplas till trappan när den ligger med kupan nedåt.

### Trappa med ingjutna wirar

Vid lyft med ingjutna wirar i trappsidan används en 4-part lyftgrimpa alternativt en monteringsbom.

Kättingarna kopplas till de ingjutna wirarna. Slitskydd eller mellanlägg ska användas där wire ligger an mot trappkanter, se fig. 1211, sid. 1.

OBS! Skilj på lyftwirar och ev. förankringswirar.

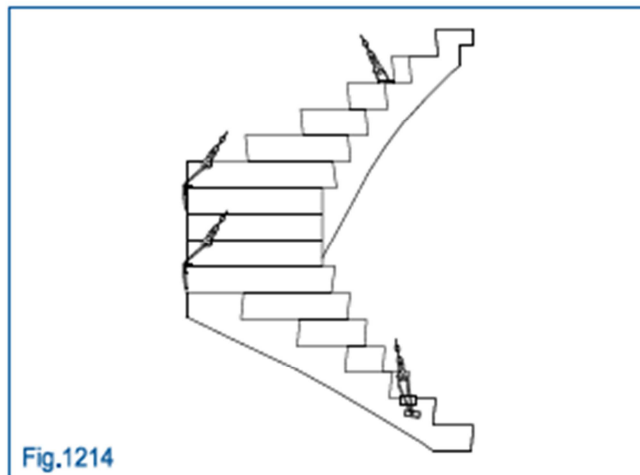

För att trappan ska hänga enligt fig. 1214 kortas kätting mot trappans överdel av alternativt används en kortare kätting.

För att justera trappans lutning i montageläge kan ett kättingblock kopplas till kätting i den nedre delen av trappan.

## Svängd enloppstrappa, en del per våning TYP M12-00-1

Montageanvisning:

### Förberedelser inför montering

Innan trappan lyfts på plats ska pallningsbrickor läggas vid vardera upplag. Igjutningsbruk läggs på trappupplaget samt i eventuell ursparing. Se monteritning för exakt utförande.

### Montering

Trappan inpassas i rätt läge med pallningsbrickor vid vardera upplagspunkt. För exakt utförande av pallning samt upplag och förankring av trappa se montagedetaljer på monteritning.

Pallningsbrickor till trappa utan fot ska läggas minst 70 mm från trappnos till kant på pallning, se fig.1215.

Eventuell höjdvariation regleras vid första och sista steget.

Om trappans läge måste finjusteras får ingen belastning med spett eller liknande förekomma 70 mm in under den främre delen av trappan, se fig. 1215 samt fig. 1212, sid. 1.

Trappupplagen med förankringsdon i- och kringgjuts med cementbruk C20/25, om ej annat anges på monteritning.

### Stämp

Trappa utan fot stämpas mot första steget se fig.1216. Säkra stämpan mot glidning. Sätt distansklossar mellan trappan och väggen, se fig. 1217.

OBS! Sätt dem så att de ej orsakar kantskador. Ta inte bort distansklossar eller stämp och använd inte trappan förrän i- och kringggjutningarna uppnått erforderlig hållfasthet.

### Demontering av lyft

När trappan är på plats lossas kättingarna och ingjuten wire kapas. Försänkning kring lyftpunkter ilagas.

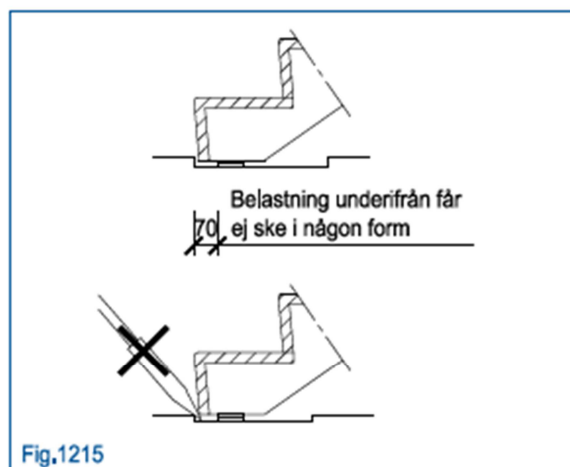


Fig.1215

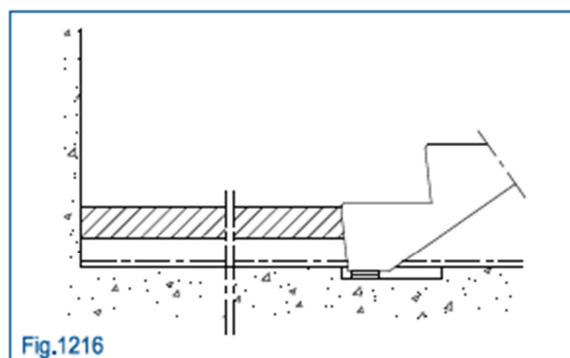


Fig.1216

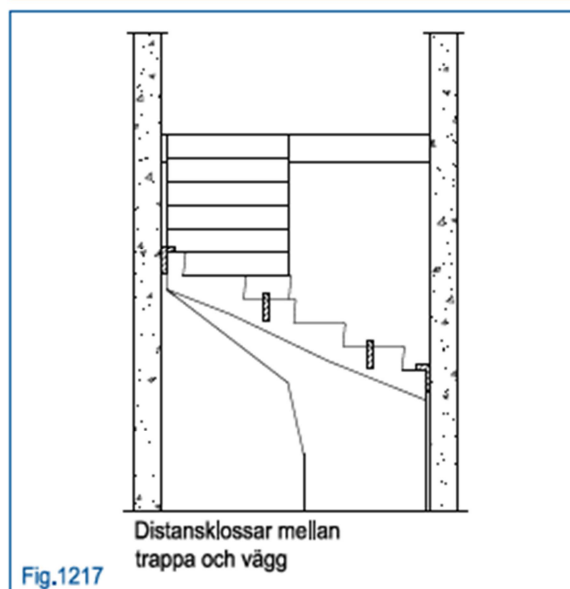


Fig.1217
